

Narrative Report Template

Compact	Niger
Compact Year and Quarter Covered in this Report	Year II (Jan-2019 to Dec-2019), Quarter 6
US Fiscal Year and Quarter	
Date of Submission	September 23th, 2019

Irrigation and Market Access Project

Project Objective: To increase rural incomes through improvements in agricultural productivity and increases in sales resulting from modernized irrigated agriculture and flood management systems with sufficient trade and market access.

Activity 1 : Irrigation Perimeter Development Activity

Activity Objective: To rehabilitate the Konni irrigation system and develop new irrigated perimeters in the Dosso-Gaya area.

Section 1: Indicator Analysis

Indicator : Value of signed irrigation feasibility and design contracts

Yearly Target	Compact Year Target	Percent of Target Complete
\$4235728	2	103,9%

[Qualitative Progress Update]

To be included:

-Progress of indicator in reference to activity:

La progression de l'indicateur est normale comparativement aux prévisions trimestrielles.

-Reasons for delays :


Pas de retard de progression pour cet indicateur au vue de la cible.

-Targets met/not met :

La cible annuelle de l'indicateur est atteinte à partir du quatrième trimestre 2019. Le niveau de contrat signés est supérieur à la cible annuelle du fait qu'il y'a eu la résiliation du contrat avec AGRER-BEM, et on a repris avec STUDI).

-Source documentation: Fiscal Agent, MCA-Niger.

Data visualizations (if applicable)

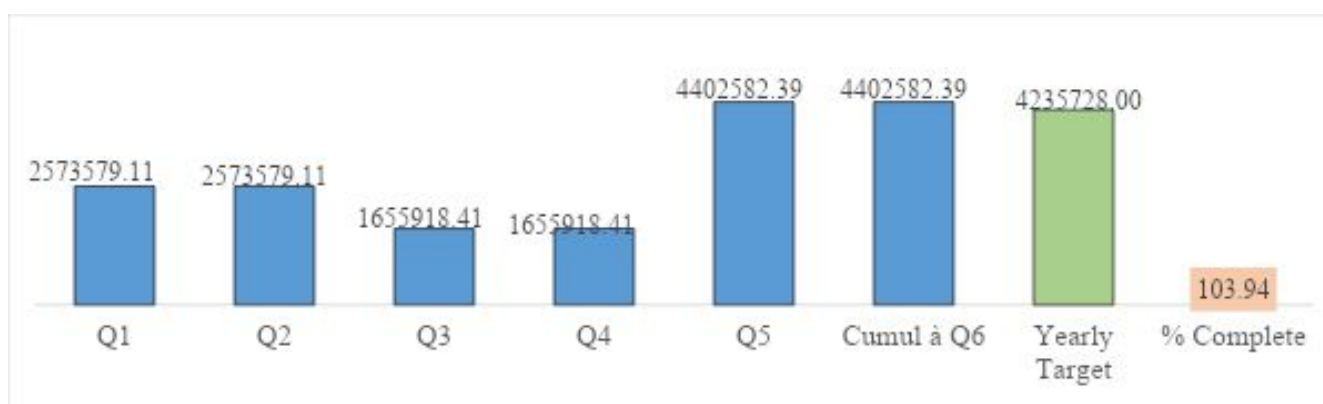

Indicator : Value of signed irrigation feasibility and design contracts (Konni)

Indicator Target	Compact Year Target	Percent of Target Complete
\$1044632	2	100%

[Qualitative Progress Update]**To be included:****-Progress of indicator in reference to activity:**

La progression de l'indicateur est normale comparativement aux prévisions trimestrielles.


-Reasons for delays :

Pas de retard de progression pour cet indicateur au vue de la cible.

-Targets met/not met :

La cible annuelle de l'indicateur est atteinte.

-Source documentation: Fiscal Agent, MCA-Niger.

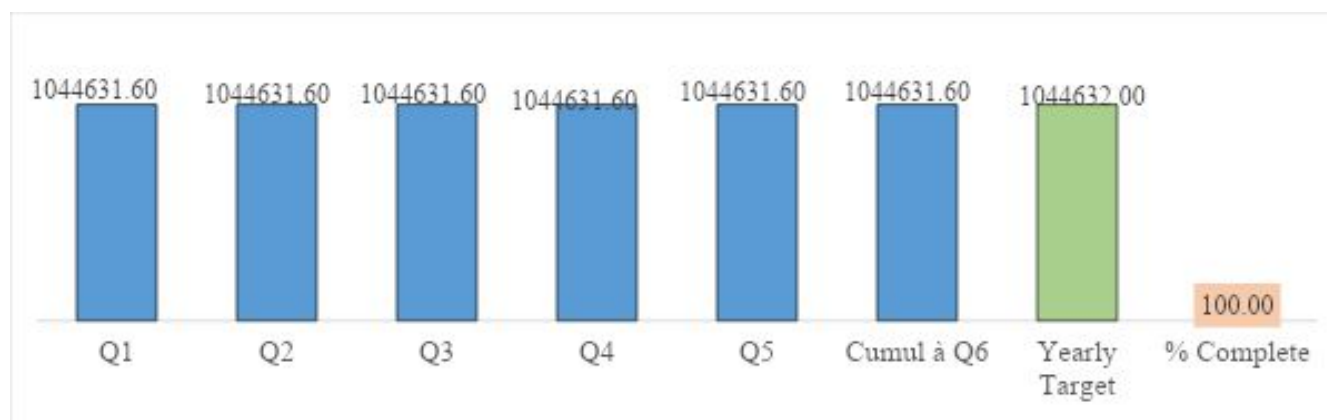Data visualizations (if applicable)**Indicator**

Value of signed irrigation feasibility and design contracts (Sia Kouanza Tondika)

Indicator Target	Compact Year Target	Percent of Target Complete
\$3191096	2	105.23%

[Qualitative Progress Update]**To be included:****-Progress of indicator in reference to activity:**

La progression de l'indicateur est normale comparativement aux prévisions trimestrielles.

-Reasons for delays :


Pas de retard de progression pour cet indicateur au vue de la cible.

-Targets met/not met :

La cible annuelle de l'indicateur est dépassée à partir du cinquième trimestre 2019. Le niveau de contrat signés est supérieur à la cible annuelle. Ce dépassement est lié au montant décaissé pour AGRER-BEM dont la prestation a été résiliée, et le contrat a été repris par STUDI)

-Source documentation: Fiscal Agent, MCA-Niger.

Data visualizations (if applicable)

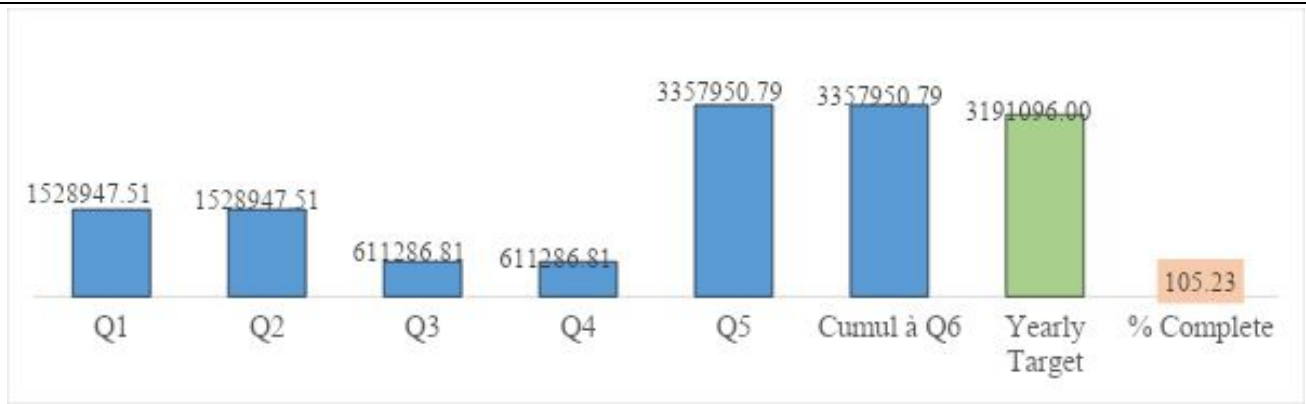

Indicator Value disbursed of irrigation feasibility and design contracts

Indicator Target	Compact Year Target	Percent of Target Complete
\$3211773	2	63,49%

[Qualitative Progress Update]

To be included:

-Progress of indicator in reference to activity:

Comparativement aux valeurs trimestrielles des contrats signés, le niveau de déboursements trimestriels est peu élevé. Néanmoins, on note 63,5 % de déboursement en rapport avec la cible annuelle. La progression de l'indicateur est normale comparativement à la cible annuelle avec près de 2/3 du montant déboursés à la mi- année 2019.

-Reasons for delays:

-Targets met/not met:

La cible cumulée trimestrielle au Q6 n'est pas atteinte mais avec un niveau acceptable de réalisation. Les activités sont en cours de réalisation avec STUDI se déroulent normalement.

-Source documentation : Fiscal Agent, MCA-Niger.

Data visualizations (if applicable)



Indicator Value disbursed of irrigation feasibility and design contracts (Konni)

Indicator Target	Compact Year Target	Percent of Target Complete
\$1044632	2	99.74%

[[Qualitative Progress Update]

To be included:

-Progress of indicator in reference to activity:

La progression de l'indicateur est normale comparativement aux prévisions trimestrielle et annuelle

-Reasons for delays:

-Targets met/not met:

La cible cumulée annuelle au Q6 pour Konni est quasi atteinte avec presque le montant des études de faisabilité et de conception déboursé.

-Source documentation : Fiscal Agent, MCA-Niger.

Data visualizations (if applicable)



Indicator : Value disbursed of irrigation feasibility and design contracts (Sia Kouanza Tondika)

Indicator Target	Compact Year Target	Percent of Target Complete
\$2167141	2	46,02%

[[Qualitative Progress Update]

To be included:

-Progress of indicator in reference to activity:

La progression de l'indicateur est moyenne comparativement aux prévisions trimestrielle et annuelle.


-Reasons for delays :

-Targets met/not met :

La cible cumulée annuelle au Q6 pour Sia Kouanza Tondika est moyenne avec un peu moins de la moitié du montant des études de faisabilité et de conception déboursé.

-Source documentation : Fiscal Agent, MCA-Niger.

Data visualizations (if applicable)

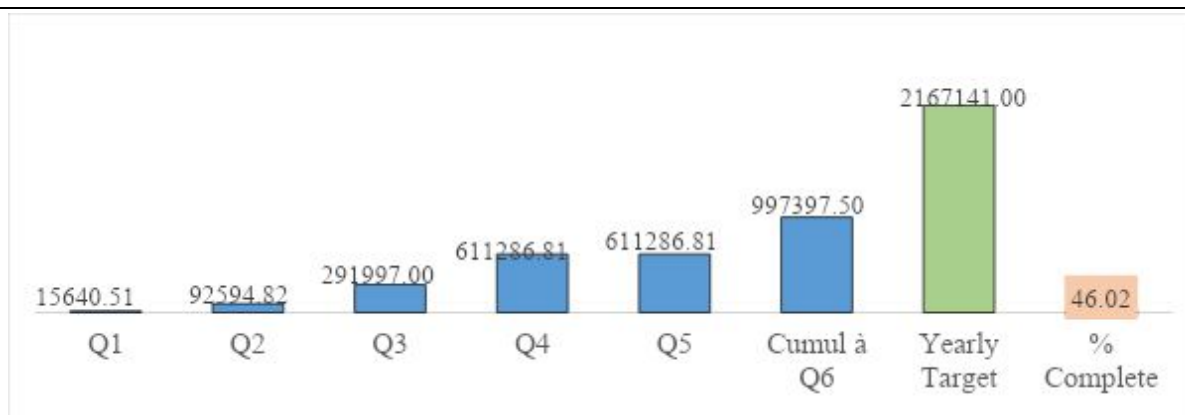

Indicator : *Percent disbursed of irrigation feasibility and design contracts*

Indicator Target	Compact Year Target	Percent of Target Complete
76%	2	60,9%

[[Qualitative Progress Update]

To be included:

-Progress of indicator in reference to activity:

La progression de l'indicateur est moins élevée comparativement aux prévisions trimestrielle et annuelle.

-Reasons for delays:

-Targets met/not met:

Les résultats montrent qu'environ 2/5 du pourcentage cible annuel du montant des études de faisabilité et de conception est déboursé. La non couverture totale du déboursement s'expliquerait par la résiliation du contrat de la firme AGRER-BEM et le travail a été repris par STUDI).

-Source documentation : Fiscal Agent, MCA-Niger.

Data visualizations (if applicable)



Indicator : *Percent disbursed of irrigation feasibility and design contracts (Konni)*

Indicator Target	Compact Year Target	Percent of Target Complete
100%	2	99,7%

[[Qualitative Progress Update]

To be included:

-Progress of indicator in reference to activity:

La progression de l'indicateur est moins élevée comparativement aux prévisions trimestrielle et annuelle.


-Reasons for delays:

-Targets met/not met:

Les résultats montrent qu'environ 1/3 du pourcentage cible annuel du montant des études de faisabilité et de conception est déboursé. Les activités sont en cours de réalisation avec STUDI se déroulent normalement).

-Source documentation : Fiscal Agent, MCA-Niger.

Data visualizations (if applicable)

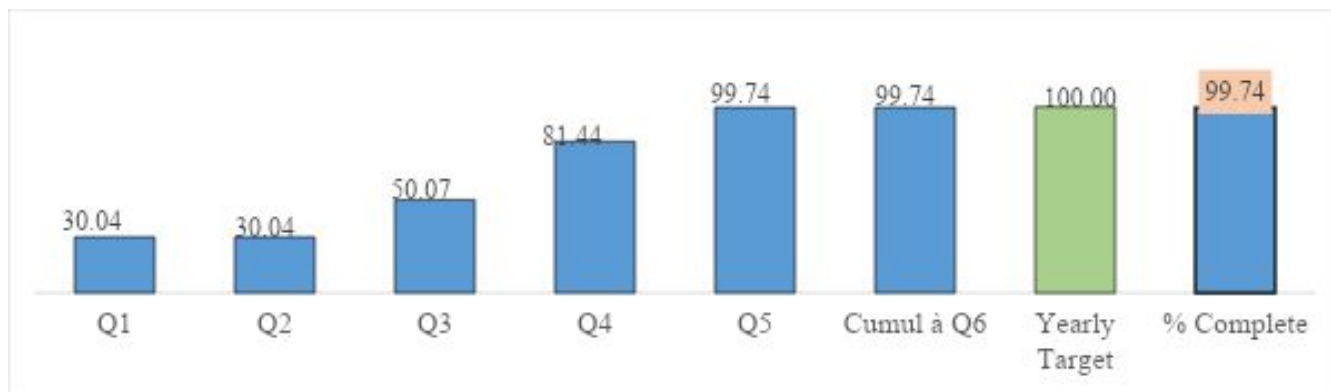

Indicator : *Percent disbursed of irrigation feasibility and design contracts (Sia Kouanza Tondika)*

Indicator Target	Compact Year Target	Percent of Target Complete
68%	2	43.7%

[[Qualitative Progress Update]

To be included:

-Progress of indicator in reference to activity:

La progression de l'indicateur est moins élevée comparativement aux prévisions trimestrielle et annuelle.


-Reasons for delays:

-Targets met/not met:

Les résultats montrent qu'un peu plus de 2/5 du pourcentage cible annuel du montant des études de faisabilité et de conception est déboursé. Il y'a eu résiliation du contrat avec AGRER-BEM et reprise avec STUDI).

-Source documentation : Fiscal Agent, MCA-Niger.

Data visualizations (if applicable)

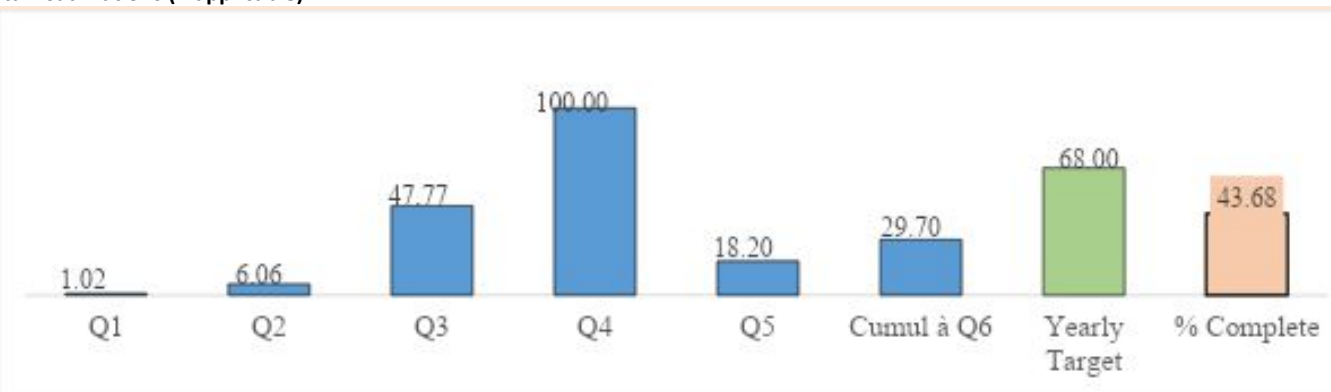

Section 2: Field Reports		
[Observations/findings from field visits and implementation studies]		
<ul style="list-style-type: none"> Les réseaux d'irrigation sont complètement dégradés, et entraînent des pertes considérables d'eau, ce qui réduit les superficies cultivables Une forte attente des communautés pour le démarrage des travaux à Konni, Sia-Kouanza-Tondika 		
Section 3: Expectations for next quarter		
Démarrage effectif des travaux de réhabilitation à konni Choix éclairé de la variante d'aménagement du périmètre irrigué de Sia-Kouanza-Tondika		
Activity 2	:	Management Services and Market Facilitation
Activity Objective: To establish a suite of institutional and management support activities designed to ensure the achievement of the Project Objective in the irrigated perimeters targeted by the Irrigation Perimeter Development Activity.		
Section 1: Indicator Analysis		
Indicator	:	
Yearly Target	Compact Year Target	Percent of Target Complete
	2	
[Qualitative Progress Update] To be included: -Progress of indicator in reference to activity -Reasons for delays -Targets met/not met -Source documentation		
Data visualizations (if applicable)		
Section 2: Field Reports		
[Observations/findings from field visits and implementation studies]		
Section 3: Expectations for next quarter		
Activity 3	:	Roads for Market Access
Activity Objective: To reduce trade barriers and improve physical market access through targeted improvements of the road network serving the Dosso-Gaya perimeters and linking them to the rest of the country.		
Section 1: Indicator Analysis		
Indicator	:	Value of signed road feasibility and design contracts
Yearly Target	Compact Year Target	Percent of Target Complete
\$3073185	2	103,24%
[Qualitative Progress Update] To be included: -Progress of indicator in reference to activity: La progression de l'indicateur est normale comparativement aux prévisions trimestrielles. -Reasons for delays :		


Pas de retard de progression pour cet indicateur au vue de la cible.

-Targets met/not met :

La cible annuelle de l'indicateur est atteinte à partir du troisième trimestre 2019. Le niveau de contrat signés est supérieur à la cible annuelle du fait de qu'il y'a eu un avenant avec le consultant AIC-PROGETTI en charge des études de la RN 35 et de la RRS. Les coûts des travaux des routes ont été initialement sous-estimés dans l'étude do diligent, ce qui a justifié l'avenant afin de prendre en compte les ajustements nécessaires).

-Source documentation : Fiscal Agent, MCA-Niger.

Data visualizations (if applicable)

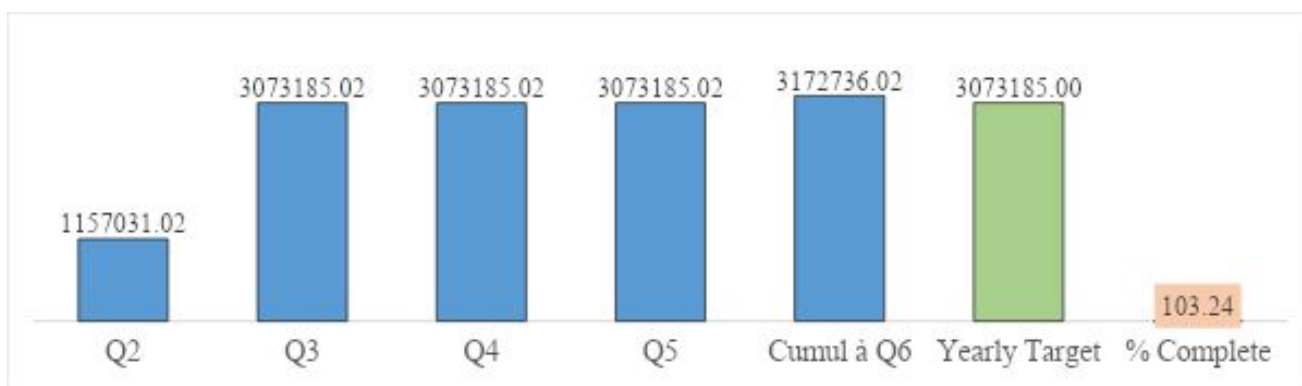

Indicator : Value of signed road feasibility and design contracts (RN-35 and Rural Road)

Yearly Target	Compact Year Target	Percent of Target Complete
\$1157031,02	2	108,6%

[Qualitative Progress Update]

To be included:

-Progress of indicator in reference to activity:

La progression de l'indicateur est normale comparativement aux prévisions trimestrielles.

-Reasons for delays :


Pas de retard de progression pour cet indicateur au vue de la cible.

-Targets met/not met :

La cible annuelle de l'indicateur est atteinte pour tous les trimestres 2019. Le niveau de contrat signés est supérieur à la cible annuelle du fait de qu'il y'a eu un avenant avec le consultant AIC-PROGETTI en charge de l'étude de la RN 35 et de la RRS. Les coûts des travaux des routes ont été initialement sous-estimés, ce qui a justifié l'avenant pour prendre en compte les ajustements nécessaires.

-Source documentation: Fiscal Agent, MCA-Niger.

Data visualizations (if applicable)

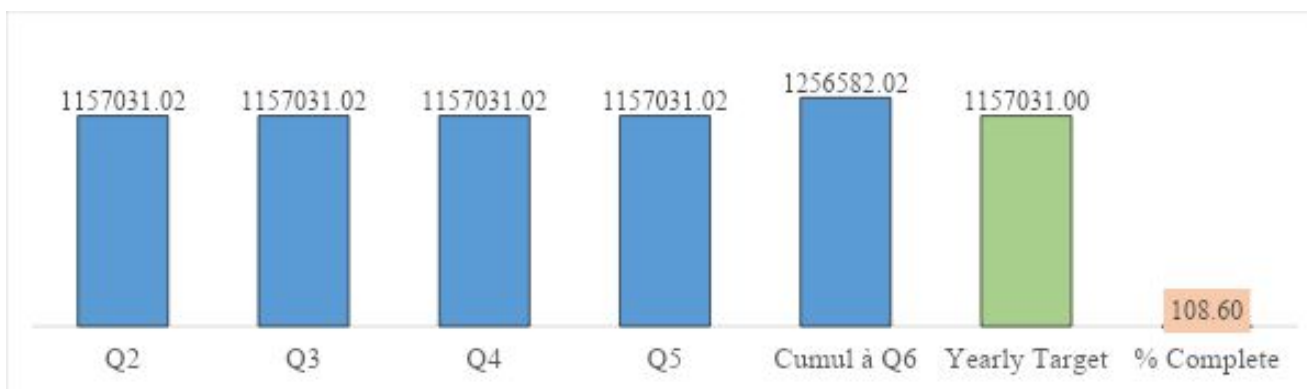

Indicator : Value of signed road feasibility and design contracts (RN-7)

Yearly Target	Compact Year Target	Percent of Target Complete
\$1916154	2	100%

[Qualitative Progress Update]

To be included:

-Progress of indicator in reference to activity:

La progression de l'indicateur est normale comparativement aux prévisions trimestrielles.

-Reasons for delays :


Pas de retard de progression pour cet indicateur au vue de la cible.

-Targets met/not met :

La cible annuelle de l'indicateur est atteinte est atteinte pour tous les trimestres 2019.

-Source documentation: Fiscal Agent, MCA-Niger.

Data visualizations (if applicable)

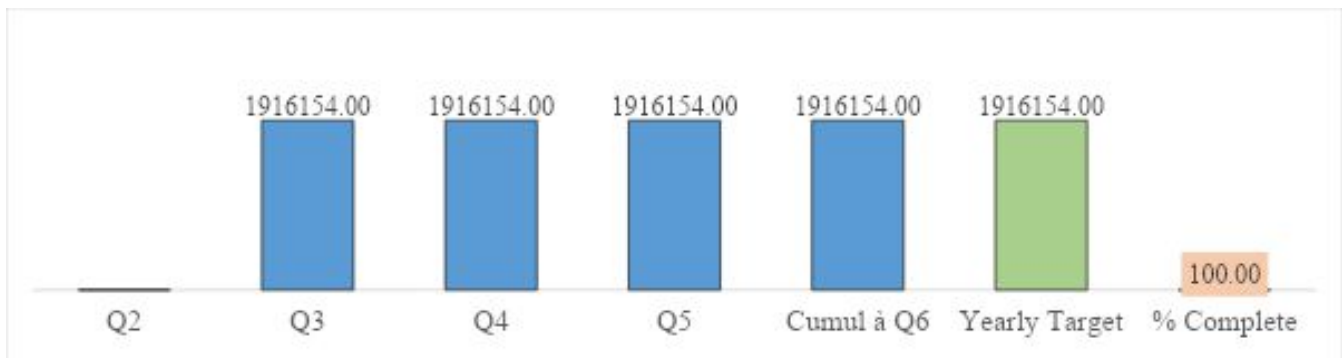

Indicator *Value disbursed of road feasibility and design contracts*

Indicator Target	Compact Year Target	Percent of Target Complete
\$3073185	2	48.14%

[Qualitative Progress Update]

To be included:

-Progress of indicator in reference to activity:

Comparativement aux valeurs trimestrielles des contrats signés, le niveau de déboursements trimestriels est peu élevé. Néanmoins, on note 48,14 % de déboursement en rapport avec la cible annuelle. La progression de l'indicateur est normale comparativement à la cible annuelle avec un peu près de la moitié (48,14 %) du montant déboursés à la mi- année 2019.

-Reasons for delays:

-Targets met/not met:

La cible cumulée trimestrielle au Q6 n'est pas atteinte mais avec un niveau acceptable de réalisation.

-Source documentation : Fiscal Agent, MCA-Niger.


Data visualizations (if applicable)



Indicator Value disbursed of road feasibility and design contracts (RN-35/Rural Road)		
Indicator Target	Compact Year Target	Percent of Target Complete
\$1157031	2	53.33%

[Qualitative Progress Update]
To be included:
-Progress of indicator in reference to activity:
 Malgré le niveau moyen de déboursement, la progression de l'indicateur est à la hausse entre les trimestres.
-Reasons for delays:

-Targets met/not met:
 La cible cumulée annuelle au Q6 pour RN-35/Rural Road n'est pas atteinte. Un peu plus de la moitié du montant des études de faisabilité et de conception a été déboursé pour RN-35/Rural Road
-Source documentation : Fiscal Agent, MCA-Niger.

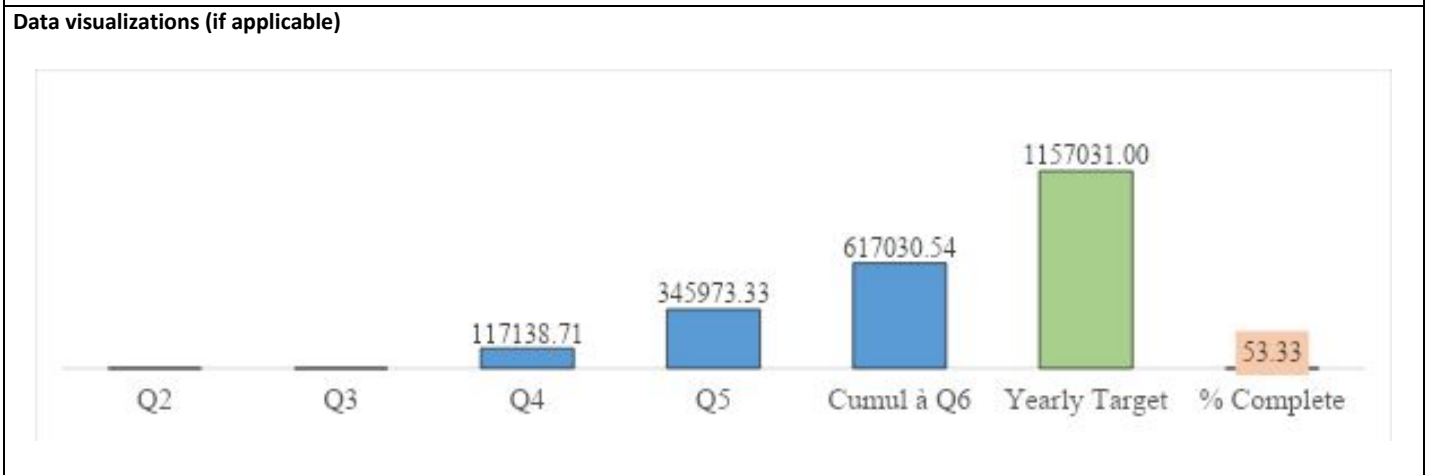

Indicator Value disbursed of road feasibility and design contracts (RN7)		
Indicator Target	Compact Year Target	Percent of Target Complete
\$1916154	2	45%

[Qualitative Progress Update]
To be included:
-Progress of indicator in reference to activity:

Malgré le niveau en dessous de la moyenne de déboursement, la progression de l'indicateur est à la hausse entre les trimestres.


-Reasons for delays:

-Targets met/not met:

La cible cumulée annuelle au Q6 pour RN-35/Rural Road n'est pas atteinte. Un peu moins de la moitié du montant des études de faisabilité et de conception a été déboursé pour RN7

-Source documentation : Fiscal Agent, MCA-Niger.

Data visualizations (if applicable)

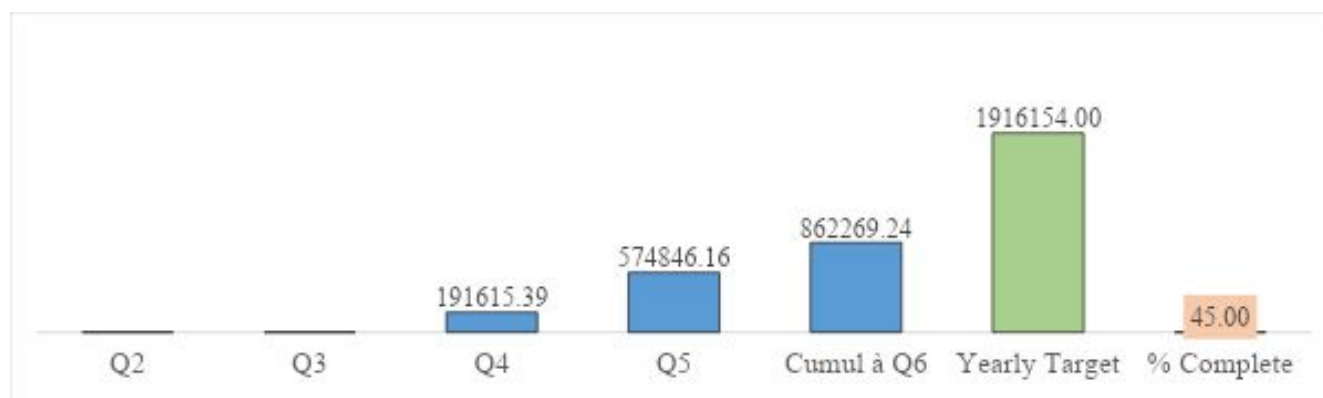

Indicator : *Percent disbursed of road feasibility and design contracts*

Indicator Target	Compact Year Target	Percent of Target Complete
\$	2	

[Qualitative Progress Update]

To be included:

-Progress of indicator in reference to activity:

Malgré le niveau en dessous de la moyenne de déboursement, la progression de l'indicateur est à la hausse entre les trimestres.


-Reasons for delays:

-Targets met/not met:

La cible cumulée annuelle au Q6 pour RN-35/Rural Road et RN7 n'est pas atteinte. Un peu moins de la moitié du montant des études de faisabilité et de conception a été déboursé pour ces deux routes.

-Source documentation : Fiscal Agent, MCA-Niger.

Data visualizations (if applicable)

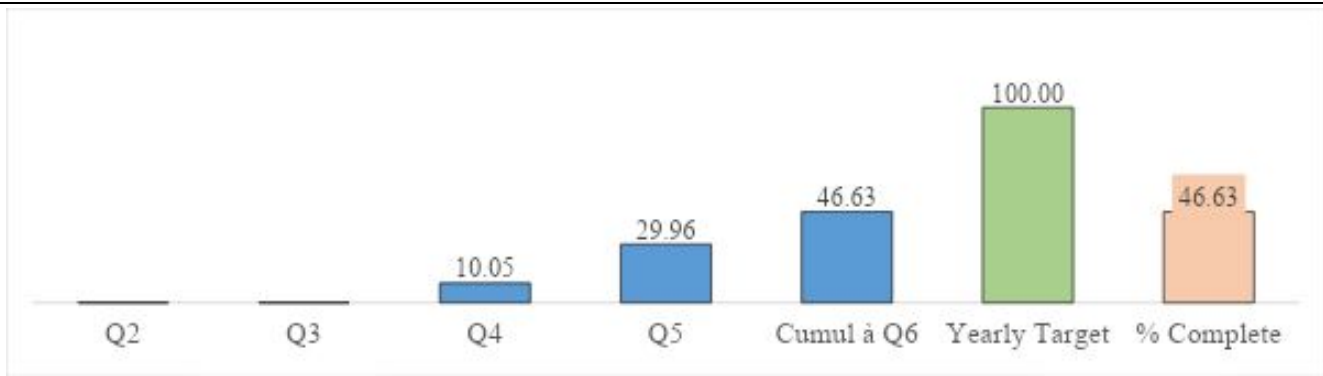

Indicator : Kilometers of roads under design

Yearly Target	Compact Year Target	Percent of Target Complete
300	2	100%

[Qualitative Progress Update]

To be included:

-Progress of indicator in reference to activity:

La progression de l'indicateur est normale comparativement aux prévisions trimestrielles.

-Reasons for delays :


Pas de retard de progression pour cet indicateur au vue de la cible.

-Targets met/not met :

La cible annuelle de l'indicateur est atteinte pour tous les trimestres 2019.

-Source documentation: Fiscal Agent, MCA-Niger.

Data visualizations (if applicable)

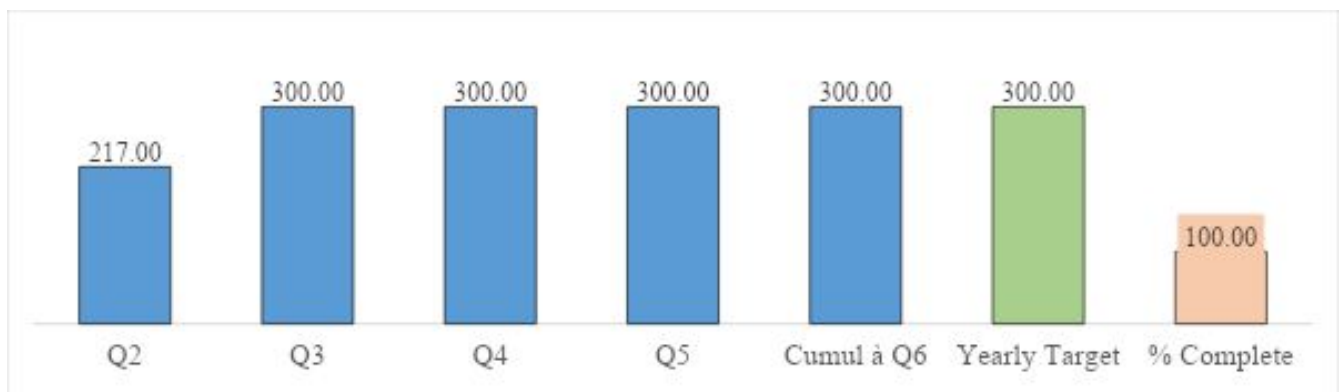

Indicator : Kilometers of roads under design (RN-35)

Yearly Target	Compact Year Target	Percent of Target Complete
180	2	101,67%

[Qualitative Progress Update]

To be included:

-Progress of indicator in reference to activity:

La progression de l'indicateur est normale comparativement aux prévisions trimestrielles.

-Reasons for delays :

Pas de retard de progression pour cet indicateur au vue de la cible.

-Targets met/not met :

La cible annuelle de l'indicateur est atteinte pour tous les trimestres 2019.

La valeur 183 KM était la première estimation de l'étude dans la demande de proposition et les résultats de recherche sur le terrain effectué par le consultant ont abouti à une distance réelle de 179,9 km (environ 180km). L'écart de 3 km par rapport à la cible est dû à cela.

-Source documentation: Fiscal Agent, MCA-Niger.

Data visualizations (if applicable)



Indicator : Kilometers of roads under design (RN-7)

Yearly Target	Compact Year Target	Percent of Target Complete
83	2	100%

[Qualitative Progress Update]

To be included:

-Progress of indicator in reference to activity:

La progression de l'indicateur est normale comparativement aux prévisions trimestrielles.

-Reasons for delays :

Pas de retard de progression pour cet indicateur au vue de la cible.

-Targets met/not met :

La cible annuelle de l'indicateur est atteinte est atteinte pour tous les trimestres 2019.

-Source documentation: Fiscal Agent, MCA-Niger.

Data visualizations (if applicable)



Indicator : Kilometers of roads under design (Rural Road)

Yearly Target	Compact Year Target	Percent of Target Complete
TBD	2	100%

[Qualitative Progress Update]**To be included:****-Progress of indicator in reference to activity:**


La progression de l'indicateur est normale comparativement aux prévisions trimestrielles.

-Reasons for delays :

Pas de retard de progression pour cet indicateur au vue de la cible.

-Targets met/not met :

La cible annuelle de l'indicateur est atteinte pour tous les trimestres 2019.

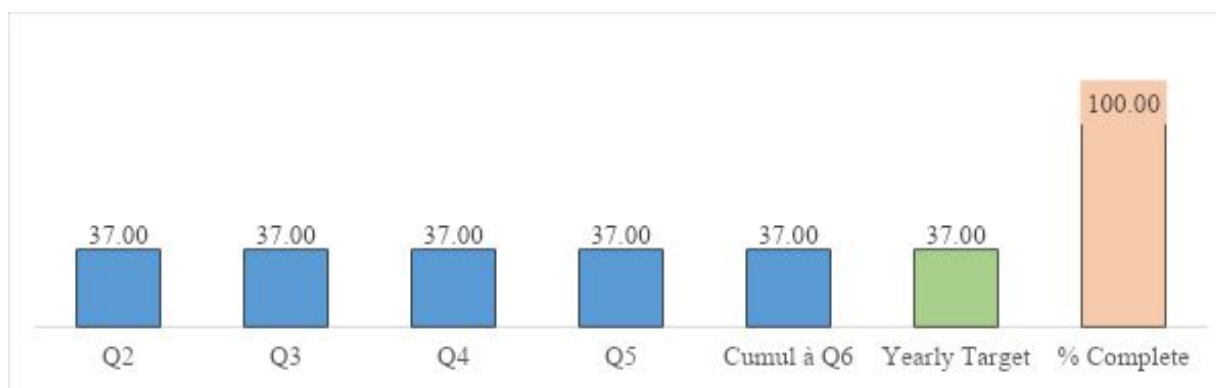-Source documentation: Fiscal Agent, MCA-Niger.**Data visualizations (if applicable)****Section 2: Field Reports****[Observations/findings from field visits and implementation studies]**

- Pour la RN 7, l'étude technique nous a montré que le trafic sur cette route est très élevé T4
- L'état de la route est fortement dégradé sur la RN 7
- Le dimensionnement a conduit à une couche de roulement en BBME (béton bitumineux en module élevé), c'est une première sur le réseau nigérien
- Sur les deux autres RN7 et RRS, les routes sont fortement dégradées et moins praticable, l'équipe route MCA-Niger a étudié plus 354 ouvrages d'arts et hydrauliques.

Section 3: Expectations for next quarter

- Elaboration et publication des DAO pour le démarrage des travaux de réhabilitation de la RN7 et la RN35
- Elaboration et publication des DAO pour le démarrage des travaux de réhabilitation de la RRS Sambéra

Climate Resilient Communities Project

Project Objective: To increase incomes for small-scale agricultural- and livestock-dependent families in Eligible Communes and Livestock Corridors in rural Niger by improving crop and livestock productivity, sustaining natural resources critical to production and increasing market sales of targeted commodities.

Activity 1 : **Climate Resilient Agriculture**

Activity Objective: To support sustainable increases in productivity and farm incomes in Eligible Communes by strengthening the resiliency of farmers and agro-pastoralists to the impacts of climate.

Section 1: Indicator Analysis

Indicator : **Applications shortlisted for proposal development**

Yearly Target	Compact Year Target	Percent of Target Complete
---------------	---------------------	----------------------------


75	2	52%
----	---	-----

[Qualitative Progress Update]

To be included:

- Progress of indicator in reference to activity
- Reasons for delays:
- Targets met/not met:
- Source documentation :

Data visualizations (if applicable)



Section 2: Field Reports

- Le retard dans le processus d'élaboration des ICRIP's et sous ICRIP's a entraîné un glissement de 3 mois sur le chemin critique.
- La non signature des accords d'entité de mise en œuvre constitue un blocage pour le démarrage du processus d'élaboration des ICRIPs qui accuse déjà 8 mois de retard et menace de compromettre gravement la mise en œuvre de l'Activité CRA.

Section 3: Expectations for next quarter

- Formation des services techniques régionaux, départementaux et communaux impliqués dans le processus ICRIPs, sur la méthodologie et les outils de collectes des données
- Finalisation et Signature des accords d'entité de mise en œuvre
- Réception des Notes Conceptuelles pour l'appel à projet du FPSP
- Recrutement et mobilisation des experts membres du Panel d'évaluation
- Atelier pour les partenaires intéressés à Niamey et aux quatre régions

Activity 1 : **PRAPS (Projet Regional d'Appui au Pastoralisme au Sahel/Niger)**

Activity Objective: To pastoralist groups and enhance regional integration by improving livestock health, upgrading water and rangeland resources along major transhumance Livestock Corridors and modernizing local livestock market infrastructure

Section 1: Indicator Analysis

Indicator : **Vaccination coverage rate**


Yearly Target	Compact Year Target	Percent of Target Complete
TBD	2	

[Qualitative Progress Update]

To be included:

- Progress of indicator in reference to activity
- Reasons for delays
- Targets met/not met
- Source documentation

Data visualizations (if applicable)

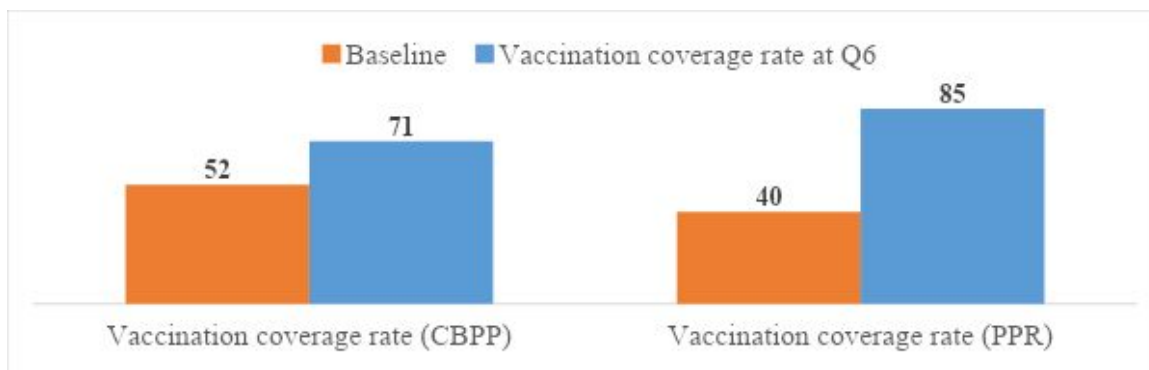

Section 2: Field Reports

- [Observations/findings from field visits and implementation studies]
- Dans le cadre de l'identification des sites SVPP, la faisabilité d'installations de ces services, le problème de santé animale se pose avec des difficultés aux services vétérinaires
- La motivation jeunes vétérinaires à s'installer en service privé
- Les difficultés d'accès concernant les recettes générées par les marchés à bétails au niveau des acteurs
- Un engouement des éleveurs a accepté les offres de services de MCA-Niger (vaccination, SVPP, réhabilitation ou construction des marchés à bétails)

Section 3: Expectations for next quarter

- Le suivi des études sur les corridors et la production des livrables
- Le suivi des activités de l'étude technique pour les marchés à bétails et la production des livrables
- Le lancement de la campagne de vaccination
- Le suivi des études des services vétérinaires SVPP avec Vétérinaires Sans Frontières Belges
