

Narrative Report Template

Compact	Niger
Année de Compact et Trimestre Couvert dans ce Rapport	Année III (Jan-2020 to Dec-2020), Trimestre 10
Année Fiscale US et Trimestre	2020/10
Date of Soumission	22 mai, 2020

Projet Irrigation et Accès aux Marchés

Objectif du projet : Augmenter les revenus ruraux en améliorant la productivité agricole et en augmentant les ventes grâce à une agriculture modernisée et irriguée et à des systèmes de gestion des inondations offrant un commerce suffisant et un accès aux marchés.

Activité 1 & 2 : Développement des périmètres d'irrigation + Routes pour Accès aux Marchés

Objectif des activités 1 & 2 :

- Réhabiliter le système d'irrigation de Konni et développer de nouveaux périmètres irrigués dans la région de Dosso-Gaya.
- Réduire les barrières commerciales et améliorer l'accès physique au marché grâce à des améliorations ciblées du réseau routier desservant les périmètres de Dosso-Gaya et les relier au reste du pays.

Section 1: Analyse de l'indicateur

Indicateur : Valeur des contrats signés des études de faisabilité et de conception des routes

Niveau de l'indicateur	Cibles pour Année 3 du Compact	Pourcentage d'Achèvement
Irrig Infra: \$4402583	\$4235728	104%
<i>Konni: \$1044632</i>	<i>\$1044632</i>	<i>100%</i>
<i>Sia-K: \$3357951</i>	<i>\$3191096</i>	<i>105%</i>
Routes: \$3172736	\$3073185	103%
<i>RN7: \$1916154</i>	<i>\$1916154</i>	<i>100%</i>
<i>RN35/RR : \$1256582</i>	<i>\$1157031</i>	<i>109%</i>

Cet indicateur est l'un de ceux qui ont connu le plus de progrès à travers les quatre activités ou composantes, à savoir l'irrigation (Konni et Sia-Kouanza), les routes (RN7 et RN35/RR). Le périmètre irrigué de Konni et la RN7 ont atteint leurs cibles respectives. Par contre l'irrigation dans sa totalité (influencée par les coûts élevés de Sia-Kouanza) et les routes dans leurs totalité (influencées par les coûts élevés de RN35/RR) ont surpassé leurs cibles respectives. Ces dépassements de cibles à Sia-Kouanza et à RN35/RR sont dus au fait que :

- le niveau de contrat signé à SKT a été plus élevé du fait de la résiliation du contrat des études avec le Consultant AGRER-BEM, et de la signature du nouveau contrat avec STUDI
- L'avenant au contrat RN35/RR signé afin de mieux caractériser les 354 ouvrages présents sur le linéaire.

-Source de documentation : Fiscal Agent, MCA-Niger.

Visualisation des données :

Valeurs (en dollars) des contrats signés : deux cibles atteintes, quatre cibles surpassées



Indicateur : Valeurs décaissées (en dollars) des contrats de faisabilité et de conception


Niveau de l'indicateur	Cibles pour Année 3 du Compact	Pourcentage d'Achèvement
Irrig Infra: \$2039273	\$4243697	48%
Konni: \$1041876	\$1044632	100%
Sia-K: \$997398	\$3199065	31%
Routes: \$ 2891541	\$3073185	94%
RN7: 1877831	\$1916154	98%
RN35/RR: \$1013710	\$1157031	88%

Les valeurs décaissées des contrats des études de faisabilité et de conception sont contrastées selon les différentes composantes. En effet, le niveau de décaissement est plus élevé au niveau des infrastructures des routes (94%) qu'au niveau de ceux d'irrigation (48%). Un peu plus de 2/3 de décaissement a été réalisé pour les autres volets excepté pour SKT où le niveau de décaissement est le plus faible (31%). Les changements en perspective pour le périmètre de Sia-Kouanza expliquent la stagnation de ce taux.

-Source de documentation : Fiscal Agent, MCA-Niger.

Visualisation des données :

Valeurs décaissées (en dollars) des contrats de faisabilité et de conception : Irrigation et Routes offrent des visages contrastés

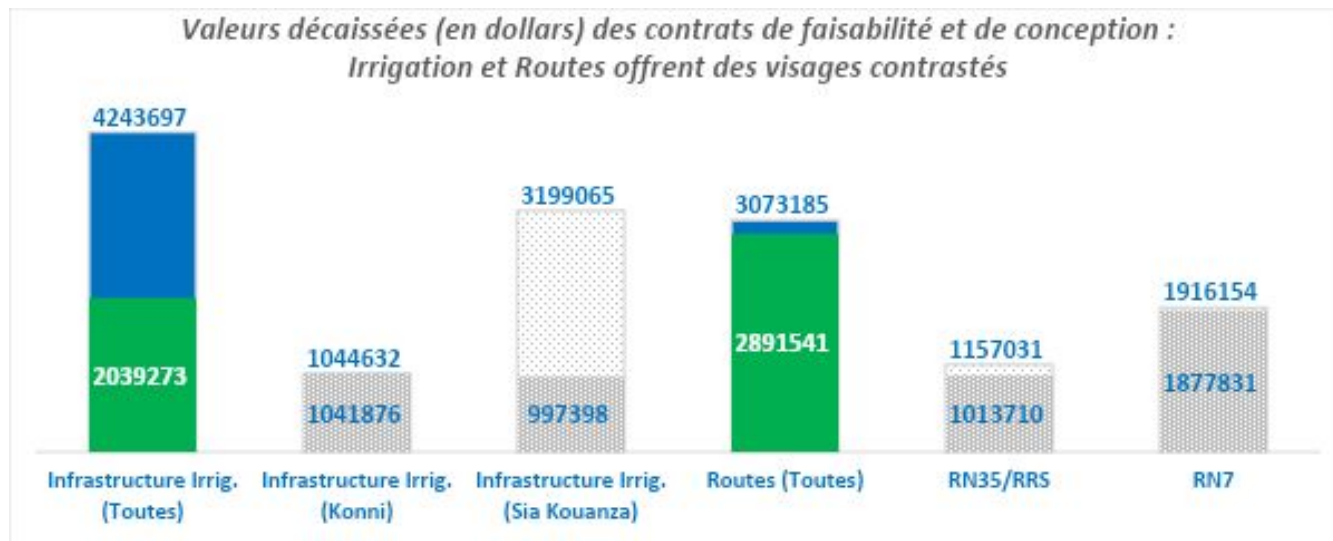

Indicateur : Pourcentage décaissé des contrats signés des études de faisabilité et de conception de l'irrigation et des routes

Niveau de l'indicateur	Cibles pour Année 3 du Compact	Pourcentage d'Achèvement
Irrig Infra : 46%		

Konni : 100%	100%	46%
Sia-K : 30%	100%	100%
Routes : 80%	100%	30%
RN7 : 81%	100%	80%
RN35/RR : 98%	100%	81%
	100%	98%

Progression de l'indicateur en référence à l'activité :

La progression de l'indicateur est normale comparativement aux prévisions trimestrielle et annuelle sauf pour le décaissement sur les infrastructures d'irrigation de SKT qui affiche un niveau plus bas.

Raison du retard :

La progression de l'indicateur est en hausse au niveau des décaissements pour les routes et stable pour l'irrigation.

Atteinte de la cible :

On note que 4/5 de la cible annuelle du montant des études de faisabilité et de conception est réalisé pour le volet routes tandis que ce pourcentage est de 46% pour le volet irrigation. La non couverture totale du déboursement s'expliquerait par la résiliation du contrat de la firme AGRER-BEM et la reprise du travail par STUDI. Bien que le contrat de STUDI ait été achevé, le paiement final n'est pas encore intervenu.

-Source documentation : Fiscal Agent, MCA-Niger.

Visualisation des données :

Indicateur : Kilomètres de route en étude de conception


Niveau de l'indicateur	Cibles pour Année 3 du Compact	Pourcentage d'Achèvement
Routes : 300	300	100%
RN35 : 180	180	100%
RN7 : 83	83	100%
RR : 37	37	100%

-Progression de l'indicateur en référence à l'activité :

Tout le linéaire de route prévu pour être aménagé dans le cadre du Compact est sous études de conception (routes RN7, RN35 et RR).

Visualisation des données :

Les études de conception ont couvert la totalité des tronçons de routes (300 km) projetés pour être sous études de conception (RN35, RN7 et RR)

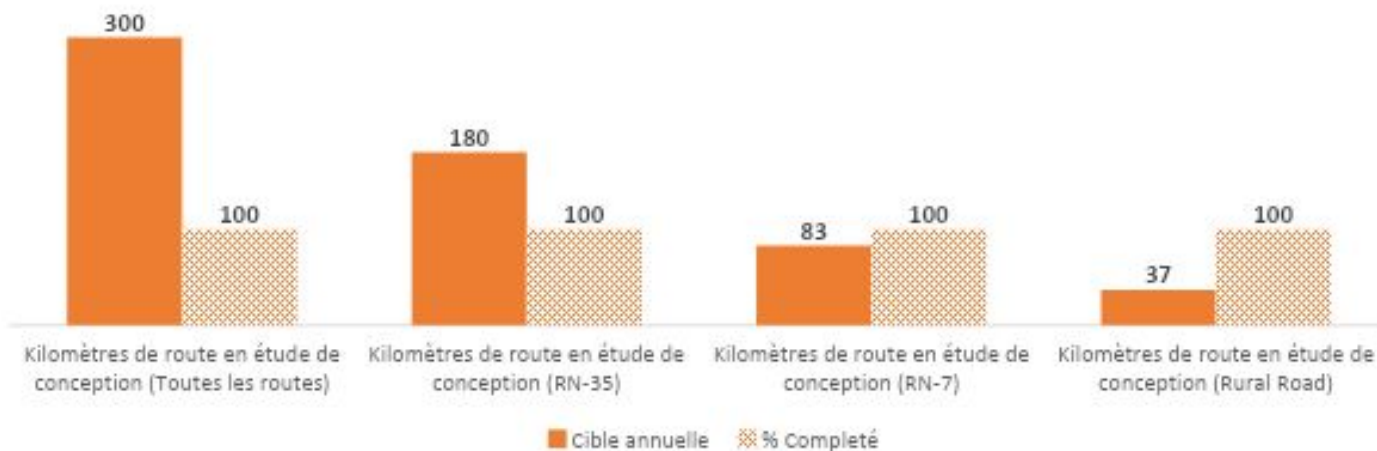

Section 2: Rapport de Terrain

Volet Irrigation :

- De la poursuite de la divulgation du PAR à partir des séances de divulgation qui mettent l'accent sur les préoccupations relatives à la compensation des arbres, des équipements sur les parcelles du périmètre, à l'emploi des jeunes avec l'entreprise, l'urgence de commencer les paiements de compensation;
- De l'opération d'ouverture de comptes;

- De la signature des ententes qui est conduite selon le planning établi et qui prend en compte la priorisation des zones à libérer pour le démarrage effectif des travaux. C'est ainsi que l'ordre de passage est planifié suivant les zones prioritaires et par GMP (Groupement Mutualiste de Production).
- Des recrutements de la main d'œuvre par l'entreprise;
- De la signature des ententes qui est conduite selon le planning établi et qui prend en compte la priorisation des zones à libérer pour le démarrage effectif des travaux. C'est ainsi que l'ordre de passage est planifié suivant les zones prioritaires et par GMP (Groupement Mutualiste de Production).
- Des recrutements de la main d'œuvre par l'entreprise;
- Une mission a eu lieu à Konni du 12 au 16 février 2020 pour un atelier d'installation officielle et de formation du comité ad hoc sur la mise en place de l'AUEI de l'AHA Konni et pour les échanges sur la validation des textes juridiques de l'AUEI par les membres dudit comité.

Volet Routes :

- D.AO/Routes : finalisation et prises en comptes des commentaires du MCC ;
- Réforme de l'entretien routier au Niger: opérationnalisation des organes FER, AMODER, CACER et validation du plan pluriannuel d'entretien routier 2020/2022.
- Publication du DAO/Routes et recrutement d'entreprises pour l'exécution des travaux: visite des site, sélection et mobilisation d'entreprise.

Section 3: Perspectives pour le prochain trimestre

Perspectives :

Volet Irrigation :

- Supervision des activités de reconnaissances des ressources en eau sur la basse terrasse Sia-Kouanza (essai de pompage, réalisation de forages tests)
- Démarrage de la tranche optionnelle renforcement des capacités du GTT

Volet Routes :

- Mobilisation du consultant pour la supervision des travaux: négocier les phases optionnelles et mobilisation pour le suivi.
- Suivre l'avancement de la réforme: réunion aux conseils d'administration des organes FER, AMODER et CACER.

Activité 2 : Services de Gestion et de Facilitation de Marché

Objectif de l'activité : Mettre en place une série d'activités d'appui institutionnel et administratif destinées à assurer la réalisation de l'objectif du projet dans les périmètres irrigués visés par l'activité de développement du périmètre d'irrigation.

Section 1: Analyse de l'indicateur

Indicateur : Parties Prenantes formées

Niveau de l'indicateur	Cibles pour Année 3 du Compact	Pourcentage d'achèvement
96	TBD	TBD

-Progrès de l'indicateur en référence à l'activité :

- Raison du retard :

Pas de retard pour cet indicateur.

- Atteinte de la cible :


La cible annuelle de l'indicateur est dépassée. Une description de contenu de personnes formées s'impose car ce qui est rapporté est plutôt le nombre de participation à une formation or, considérer qu'une personne est formée requiert des critères d'acquisition de connaissances devant être clairement défini ainsi que la méthode de comptabilisation.

-Source documentation

Staff service de gestion

Visualisation des données :

**96 personnes sont formées au total dont environ
24 % de femmes au trimestre Q9**



Section 2: Rapport de Terrain

- De la poursuite de la divulgation du PAR à partir des séances de divulgation qui mettent l'accent sur les préoccupations relatives à la compensation des arbres, des équipements sur les parcelles du périmètre, à l'emploi des jeunes avec l'entreprise, l'urgence de commencer les paiements de compensation;
- De l'opération d'ouverture de comptes;
- De la signature des ententes qui est conduite selon le planning établi et qui prend en compte la priorisation des zones à libérer pour le démarrage effectif des travaux. C'est ainsi que l'ordre de passage est planifié suivant les zones prioritaires et par GMP (Groupement Mutualiste de Production).
- Des recrutements de la main d'œuvre par l'entreprise;
- De la signature des ententes qui est conduite selon le planning établi et qui prend en compte la priorisation des zones à libérer pour le démarrage effectif des travaux. C'est ainsi que l'ordre de passage est planifié suivant les zones prioritaires et par GMP (Groupement Mutualiste de Production).
- Des recrutements de la main d'œuvre par l'entreprise;
- Une mission a eu lieu à Konni du 12 au 16 février 2020 pour un atelier d'installation officielle et de formation du comité ad hoc sur la mise en place de l'AUEI de l'AHA Konni et pour les échanges sur la validation des textes juridiques de l'AUEI par les membres dudit comité.

Section 3: Perspectives pour le prochain trimestre

- Supervision des activités de reconnaissances des ressources en eau sur la basse terrasse Sia-Kouanza (essai de pompage, réalisation de forages tests)
- Démarrage de la tranche optionnelle renforcement des capacités du GTT

Projet Communautés Résilientes au Climat

Objectif du projet : Augmenter les revenus des petites familles dépendant de l'agriculture et de l'élevage dans les corridors éligibles des communes et du bétail dans les zones rurales du Niger en améliorant la productivité des cultures et de l'élevage, en préservant les ressources naturelles essentielles à la production et en augmentant les ventes sur le marché des produits ciblés.

Activité 1 : Agriculture Résiliente au Climat

Objectif de l'activité : Soutenir les augmentations durables de la productivité et des revenus agricoles dans les communes éligibles en renforçant la résilience des agriculteurs et des agro-pasteurs face aux effets du climat.

Section 1: Indicateur Analysis

Indicateur : Demandes retenues pour le développement de propositions

Niveau de l'indicateur	Cibles pour Année 3 du Compact	Pourcentage d'Achèvement
39	85	46%

-Progression de l'indicateur en référence à l'activité :

Au trimestre Q9, la progression de l'indicateur est normale au vu de la cible de l'an 3 avec un peu moins de la moitié (46%) de demandes retenues pour le développement de proposition par rapport à l'effectif attendu.

- Raison du retard :

- Atteinte de la cible :

-Source documentation : USADF Quarterly Report (April-June 2019), July 2019

Visualisation des données :



Indicateur

: Demandes reçues

Niveau de l'indicateur	Cibles pour Année 3 du Compact	Pourcentage d'Achèvement
567	750	76%

- Progression de l'indicateur en référence à l'activité :

Le niveau de progression de l'indicateur est normal avec plus de 3/4 de la cible annuelle (an 3) atteinte.


- Raison du retard :

- Atteinte de la cible :

-Source documentation : USADF Quarterly Report (April-June 2019), July 2019

Visualisation des données

567 demandes sont reçues au total sur une cible annuelle de 750, soit 76%

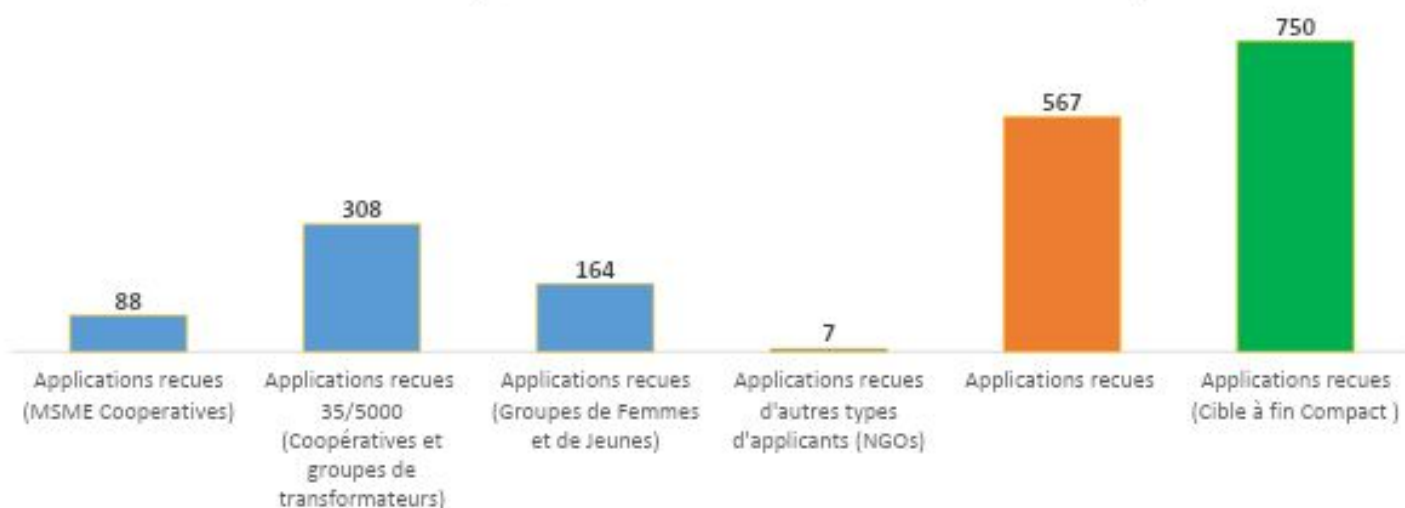

Section 2: Rapport de Terrain

- Mobilisation des services techniques (régionaux, départementaux et communaux), des autorités communales et la communauté pour le processus des ICRIPs dans 12 communes.
- Signature des contrats de 4 consultants pour appuyer le processus ICRIPs et assurance qualité.
- Clôture de l'Appel à proposition, analyses de proposition reçues et dépôt du draft de rapport produit par le paneliste pour le fond du partenariat
- Plus de 55 dossiers sont approuvés dans le cadre du Grant US ADF et les conventions sont en train d'être signés.

Section 3: Perspectives pour le prochain trimestre

ICRIPs :

- La validation des ICRIPs en session du conseil communal,
- La restitution des ICRIPs aux conseils régionaux et aux Gouvernorats de la zone du CRA,
- Sélection des cabinets et démarrage des études techniques pour la petite irrigation dans les 16 communes du CRA,
- Lancement du DAO GRN pour le recrutement des prestataires (ONG, GIE...),

Fond du partenariat

- La validation au niveau MCA et du MCC du rapport d'analyses de proposition reçues, produit par les panelistes pour le fond du partenariat,
- La Dou diligence,
- La validation des candidats retenus pour la subvention du fond de partenariat,
- La signature des conventions de partenariat entre le MCA et les promoteurs sélectionnés pour le fond du partenariat,

Grant US ADF :

- La signature des conventions de plus de 55 dossiers approuvés,
- Le lancement du deuxième appel à proposition en début du mois de juin 2020.

Activité 2 : PRAPS (Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel/Niger)

Objectif de l'activité : Aux groupes de pasteurs et au renforcement de l'intégration régionale en améliorant la santé du bétail, en valorisant les ressources en eau et en pâturages le long des principaux corridors de transhumance et en modernisant les infrastructures locales du marché de l'élevage

Section 1: Analyse de l'indicateur

Indicateur : Taux de couverture vaccinale

Niveau de l'indicateur	Cibles pour Année 3 du Compact	Pourcentage d'Achèvement
------------------------	--------------------------------	--------------------------

TBD	3	TBD
-----	---	-----

- Progression de l'indicateur en référence à l'activité :

Cet indicateur a une portée annuelle. Le niveau actuel de réalisation est celui des trimestres passés de l'année sous revue.


- Raison du retard :

- Atteinte de la cible :

-Source documentation

Visualisation des données

19% de hausse du Taux de couverture vaccinale pour CBPP et 45% de hausse pour PPR comparé à leurs niveaux de référence

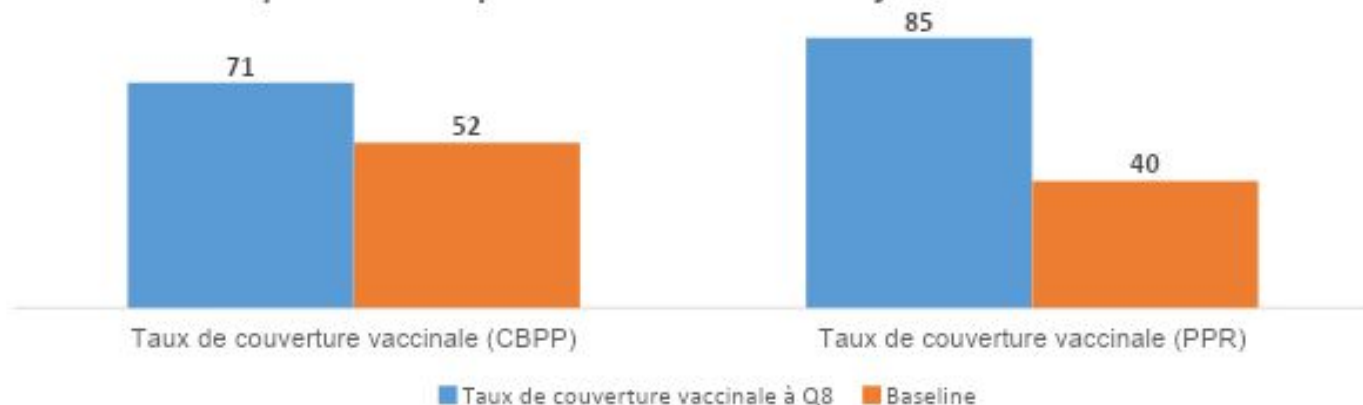

Section 2: Rapport de Terrain

- La contractualisation pour le développement des plans d'investissements pastoraux Lot 2 (Tahoua et Maradi);
- Les accords d'entités entre le MAG/EL et le MCA-Niger.
- Livraison par Centravet du matériel de marquage: 6 mai 2020
- Validation des PAP des départements pilote avec les COFOCOM : 8 mai 2020
- Difficulté de mettre en place le fonds durable de vaccination
- Non-respect des délais par les entreprises
- Retard de livraison des vaccins

Section 3: Perspectives pour le prochain trimestre

- Suivi de la mise en œuvre du contrat VSF/ONG Karkara relatif à l'installation des SVPP et évaluation des besoins en renforcement des capacités des anciens. Réception et validation des livrables:
- L3: Rapport de sélection des Vétos et leurs adjoint 7 avril 2020
- L4 Formation des SVPP 10 juin.
- Lot 1(BERIA): Plan d'aménagement des départements restants: 1 juin 2020
- Atelier de présentation et de priorisation des investissements 9 juin 2020
- Accord social phase post pilote : 1 juin 2020
- PAP des départements pilotes accompagnés par les cartes dép. et les données SIG: 9 juin 2020
- Signature avenant du lot 2 (Tahoua et Maradi); Négociation et contractualisation avec AGEGRHAU
