

Narrative Report Template

Compact	Niger
Année de Compact et Trimestre Couvert dans ce Rapport	Année III (Jan-2020 to Dec-2020), Trimestre 9
Année Fiscale US et Trimestre	2020/09
Date of Soumission	28 Février, 2020

Projet Irrigation et Accès aux Marchés

Objectif du projet : Augmenter les revenus ruraux en améliorant la productivité agricole et en augmentant les ventes grâce à une agriculture modernisée et irriguée et à des systèmes de gestion des inondations offrant un commerce suffisant et un accès aux marchés.

Activité 1 & 2 : Développement des périmètres d'irrigation + Routes pour Accès aux Marchés

Objectif des activités 1 & 2 :

- Réhabiliter le système d'irrigation de Konni et développer de nouveaux périmètres irrigués dans la région de Dosso-Gaya.
- Réduire les barrières commerciales et améliorer l'accès physique au marché grâce à des améliorations ciblées du réseau routier desservant les périmètres de Dosso-Gaya et les relier au reste du pays.

Section 1: Analyse de l'indicateur

Indicateur : Valeur des contrats signés des études de faisabilité et de conception des routes

Cibles d'Indicateurs	Cibles pour Année 3 du Compact	Pourcentage d'Achèvement
Irrig Infra: \$4402583	\$4235728	104%
<i>Konni: \$1044632</i>	<i>\$1044632</i>	<i>100%</i>
<i>Sia-K: \$3357951</i>	<i>\$3191096</i>	<i>105%</i>
Routes: \$3172736	\$3073185	103%
<i>RN7: \$1916154</i>	<i>\$1916154</i>	<i>100%</i>
<i>RN35/RR : \$1256582</i>	<i>\$1157031</i>	<i>109%</i>

Cet indicateur est l'un de ceux qui ont connu le plus de progrès à travers les quatre activités ou composantes, à savoir l'irrigation (Konni et Sia-Kouanza), les routes (RN7 et RN35/RR). De toutes ces subdivisions, le périmètre irrigué de Konni et la RN7 sont à bout de leurs cibles respectives. Par contre l'irrigation dans sa totalité (influencée par les coûts élevés de Sia-Kouanza) et les routes dans leurs totalité (influencées par les coûts élevés de RN35/RR) ont surpassé leurs cibles respectives. Ces dépassements de cibles à Sia-Kouanza et à RN35/RR sont dus au fait que :

- le niveau de contrat signé à SKT est celui dont la cible a été dépassée du fait de la résiliation du contrat avec le Consultant AGRER-BEM, et de la signature du nouveau contrat avec STUDI)
- L'avenant au contrat RN35/RR signé afin de mieux caractériser les 354 ouvrages présents sur le linéaire.

-Source de documentation : Fiscal Agent, MCA-Niger.

Visualisation des données :

Valeurs (en dollars) des contrats signés : deux cibles atteintes, quatre cibles surpassées



Indicateur : Valeurs décaissées (en dollars) des contrats de faisabilité et de conception


Cibles d'Indicateurs	Cibles pour Année 3 du Compact	Pourcentage d'Achèvement
Irrig Infra: \$2039273	\$4243697	48%
Konni: \$1041876	\$1044632	100%
Sia-K: \$997398	\$3199065	31%
Routes: \$2546633	\$3073185	83%
RN7: \$1532923	\$1916154	80%
RN35/RR: \$1013710	\$1157031	88%

Les valeurs décaissées des contrats des études de faisabilité et de conception sont contrastées selon les différentes composantes. En effet, le niveau de décaissement est plus élevé au niveau des infrastructures des routes (83%) qu'au niveau d'irrigation (48%). Cependant, le montant total prévu pour la cible annuelle a été entièrement décaissé pour Konni alors que moins de la moitié de ce montant a été décaissé pour SKT, dû au retard lié au changement de consultant (passage de AGRER-BEM à STUDI). Un peu plus de 2/3 de décaissement a été réalisé pour les autres volets excepté pour SKT où le niveau de décaissement est le plus faible (30%).

-Source de documentation : Fiscal Agent, MCA-Niger.

Visualisation des données :

Valeurs décaissées (en dollars) des contrats de faisabilité et de conception : Irrigation et Routes offrent des niveaux de décaissement contrastés

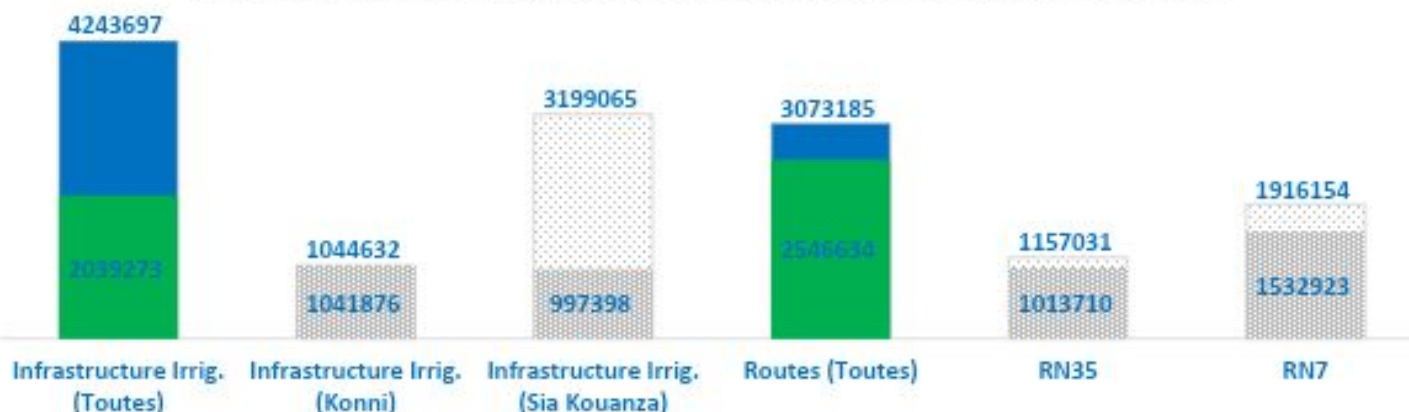

Indicateur : Pourcentage décaissé des contrats signés des études de faisabilité et de conception de l'irrigation et des routes

Cibles d'Indicateurs	Cibles pour Année 3 du Compact	Pourcentage d'Achèvement
----------------------	--------------------------------	--------------------------

Irrig Infra : 46% Konni : 100% Sia-K : 30% Routes : 80% RN7 : 80% RN35/RR : 81%	100% 100% 100% 100% 100% 100%	46% 100% 30% 80% 80% 81%
--	--	---

Progression de l'indicateur en référence à l'activité :

La progression de l'indicateur est normale comparativement aux prévisions trimestrielle et annuelle.

Raison du retard :

La progression de l'indicateur est en hausse sur la période

Atteinte de la cible :

On note que 4/5 du pourcentage de la cible annuelle du montant des études de faisabilité et de conception est déboursé pour le volet routes tandis que ce pourcentage est de 46% pour le volet irrigation. La non couverture totale du déboursement s'expliquerait par la résiliation du contrat de la firme AGRER-BEM et la reprise du travail par STUDI.

-Source documentation : Fiscal Agent, MCA-Niger.

Visualisation des données :

Indicateur : Kilomètres de route en étude de conception


Cibles d'Indicateurs	Cibles pour Année 3 du Compact	Pourcentage d'Achèvement
Routes : 300	300	100%
RN35 : 180	180	100%
RN7 : 83	83	100%
RR : 37	37	100%

-Progression de l'indicateur en référence à l'activité :

Le nombre de kilomètres sous études de conception est effectif pour les routes RN7, RN35 et RR.

Visualisation des données :

Les études de conception ont couvert la totalité des tronçons de routes (300 km) projetés pour être sous études de conception (RN35, RN7 et RR)

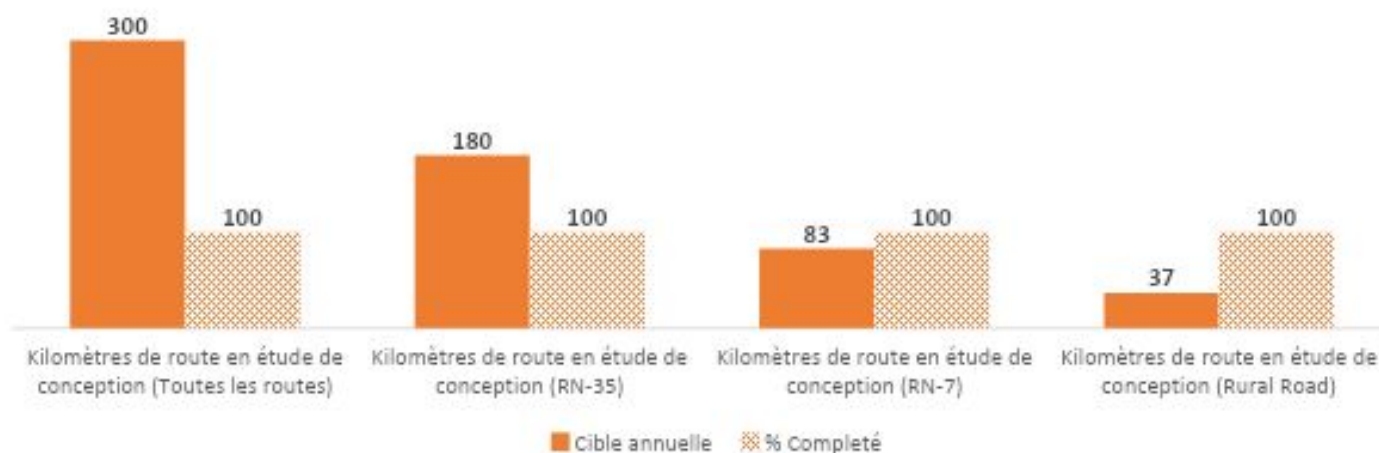

Section 2: Rapport de Terrain

Volet Irrigation :

- Contrat N° IR/MSM/2/F.0045/19 reformes ressources en eau :
- Achèvement de la composante A en fin novembre 2019 de la tranche ferme avec la tenue de l'atelier de validation des livrables de cette composante

- Activation de la tranche optionnelle, suivi de l'Avenant N° 2 au contrat RTI pour l'élaboration de la composante C renforcement des capacités du Groupe Technique de Travail (GTT),
- Contrat IR/MSM/2/IC/.0050/19 Reformes, Consultant individuel hydraulicien
- Mission prospective sur la basse terrasse de Sia-Kouanza pour un inventaire des ressources en eau pour l'irrigation.
- Avenant N° 4 au contrat IR/MSM/2/IC/.0050/19 pour prolonger le contrat de 1 an pour le suivi de la tranche optionnelle.

Volet Routes :

- Enoncé des travaux des routes du Compact : RN7, RN35/RRS validations et finalisation de toutes les parties ;
- D.AO/Routes : finalisation et prises en comptes des commentaires du MCC ;
- Réforme de l'entretien routier au Niger: opérationnalisation des organes FER, AMODER, CACER et validation du plan pluriannuel d'entretien routier 2020/2022.

Section 3: Perspectives pour le prochain trimestre

Perspectives :

Volet Irrigation :

- Revue des livrables finaux de la composante A,
- Renforcement des capacités du GTT sur le terrain à l'usage des tablettes destinées à l'exploration des ressources en eau souterraines
- Achèvement de la composante B de la tranche ferme et atelier de validation des livrables,
- Démarrage de la tranche optionnelle renforcement des capacités du GTT
- Supervision des activités de reconnaissances des ressources en eau sur la basse terrasse Sia-Kouanza (essai de pompage, réalisation de forages tests)

Volet Routes :

- Lancement DAO/Routes et recrutement d'entreprises pour l'exécution des travaux: visite des site, sélection et mobilisation d'entreprise.
- Consultant pour la supervision des travaux: négocier les phases optionnelles et mobilisation pour le suivi.
- Suivre l'avancement de la réforme: réunion aux conseils d'administration des organes FER,AMODER et CACER.

Activité 2 : Services de Gestion et de Facilitation de Marché

Objectif de l'activité : Mettre en place une série d'activités d'appui institutionnel et administratif destinées à assurer la réalisation de l'objectif du projet dans les périmètres irrigués visés par l'activité de développement du périmètre d'irrigation.

Section 1: Analyse de l'indicateur

Indicateur : Parties Prenantes formées

Cibles d'Indicateurs	Cibles pour Année 3 du Compact	Pourcentage d'Achèvement
96	TBD	TBD

-Progrès de l'indicateur en référence à l'activité :

La progression de l'indicateur est normale au vue de la cible annuelle.

- Raison du retard :

Pas de retard pour cet indicateur.

- Atteinte de la cible :


La cible annuelle de l'indicateur est dépassée. Une description de contenu de personnes formées s'impose car ce qui est rapporté est plutôt le nombre de participation à une formation or, considérer qu'une personne est formée requiert des critères d'acquisition de connaissances devant être clairement défini ainsi que la méthode de comptabilisation. Une concertation est en cours pour clarifier ces aspects avec l'équipe foncière.

-Source documentation

Staff service de gestion

Visualisation des données :

**96 personnes sont formées au total dont environ
24 % de femmes au trimestre Q9**



Section 2: Rapport de Terrain

Gestion Durable du Système d'Irrigation (GDSI)

- Mission d'installation officielle à Konni du 12 au 16 février 2020 et formation du comité ad hoc sur la mise en place de l'AUEI et de l'AHA et échanges sur la validation des textes juridiques de l'AUEI par les membres.
- Travaux d'amendements des dossiers d'avenants : MAGEL et ONAHA
- Avenant N°4 du contrat portant réajustement des livrables concernant Konni et Sia et Konza pendant la période optionnelle du contrat CACG
- Service d'Accompagnement Agricole (SAA)

SAA

- Avenant N°3 portant sur le décalage de la soumission des livrables qui concernent SIA Konza pendant la période de base du consultant Cowater Sogema CECI
- Mission du Consultant Alpha de MCC pour apporter un soutien technique au volet alphabétisation et santé du programme Compact Niger
- Finalisation du livrable N° 5 (Rapport d'avancement trimestre 4)

Réforme Engrais

- Avenant N° 2 au contrat fertiliser (IFDC)
- Atelier OMEN et COTEN pour le plan d'action de l'approvisionnement pour la campagne agricole 2020-2021
- Assemblée Générale Ordinaire de l'ANIDE (Association Nigérienne des Importateurs et distributeurs d'engrais) du 12 au 14 février 2020
- Mission MCA-Niger à la conférence organisée par la plateforme paysanne le 18 décembre 2019 à Tillabéry
- Partage de plan de la réforme du secteur des engrais au Niger le 20 février 2020
- Partage du livrable 9 rapport du programme pilote de subvention (PARSEN) 17 février 2020, 1er draft

Section 3: Perspectives pour le prochain trimestre

GDSI

- Fin de la tranche ferme de GDSI et début de la tranche ferme optionnelle de GDSI

SAA

- Mission conjointe de suivi des activités sur le terrain

Réforme Engrais

- Activation de la tranche optionnelle du contrat IFDC
- La tenue d'une table ronde sur la réforme du secteur des engrais le 02 mars 2020 à Niamey
- Avoir la version finale du livrable N°9

Section 2: Rapport de Terrain

[Observations/findings from field visits and implementation studies]

-

Section 3: Perspectives pour le prochain trimestre

- Obtenir les certificats de conformité environnementale pour exécuter ces projets routiers

Projet Communautés Résilientes au Climat

Objectif du projet : Augmenter les revenus des petites familles dépendant de l'agriculture et de l'élevage dans les corridors éligibles des communes et du bétail dans les zones rurales du Niger en améliorant la productivité des cultures et de l'élevage, en préservant les ressources naturelles essentielles à la production et en augmentant les ventes sur le marché des produits ciblés.

Activité 1 : Agriculture Résiliente au Climat

Objectif de l'activité : Soutenir les augmentations durables de la productivité et des revenus agricoles dans les communes éligibles en renforçant la résilience des agriculteurs et des agro-pasteurs face aux effets du climat.

Section 1: Indicateur Analysis

Indicateur : Demandes retenues pour le développement de propositions

Cibles d'Indicateurs	Cibles pour Année 3 du Compact	Pourcentage d'Achèvement
39	85	46%

-Progression de l'indicateur en référence à l'activité :


Au trimestre Q9, la progression de l'indicateur est normale au vu de la cible de l'an 3 avec un peu moins de la moitié (46%) de demandes retenues pour le développement de proposition par rapport à l'effectif attendu.

- Raison du retard :

- Atteinte de la cible :

-Source documentation : USADF Quarterly Report (April-June 2019), July 2019

Visualisation des données :



Indicateur : Demandes reçues

Cibles d'Indicateurs	Cibles pour Année 3 du Compact	Pourcentage d'Achèvement
567	750	76%

- Progression de l'indicateur en référence à l'activité :

Le niveau de progression de l'indicateur est normal avec plus de 3/4 de la cible annuelle (an 3) atteinte.


- Raison du retard :

- Atteinte de la cible :

-Source documentation : USADF Quarterly Report (April-June 2019), July 2019

Visualisation des données

567 demandes sont reçues au total sur une cible annuelle de 750, soit 76%



Section 2: Rapport de Terrain

- Mission du manager CRA pour la signature des accords d'entités avec les communes.
- Formation des membres des services techniques, départementaux et les acteurs communaux sur la méthodologie ICRIPs et les outils de collecte des données;
- Organisation des séances de consultations publiques au niveau des grappes.
- Collecte des données des ICRIPs

Section 3: Perspectives pour le prochain trimestre

- Finaliser le processus de recrutement de consultant pour la formation des COFOCOMs
- Élaboration des notes conceptuelles des ICRIPs et sous ICRIPs
- Finalisation de la sélection des dossiers des 10 prometteurs sur la short List.

Activité 2 : PRAPS (Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel/Niger)

Objectif de l'activité : Aux groupes de pasteurs et au renforcement de l'intégration régionale en améliorant la santé du bétail, en valorisant les ressources en eau et en pâturages le long des principaux corridors de transhumance et en modernisant les infrastructures locales du marché de l'élevage

Section 1: Analyse de l'indicateur


Indicateur : Taux de couverture vaccinale

Cibles d'Indicateurs	Cibles pour Année 3 du Compact	Pourcentage d'achèvement
TBD	3	TBD

- Progression de l'indicateur en référence à l'activité :
- Raison du retard :
- Atteinte de la cible :
- Source documentation

Visualisation des données

19% de hausse du Taux de couverture vaccinale pour CBPP et 45% de hausse pour PPR comparé à leurs niveaux de référence

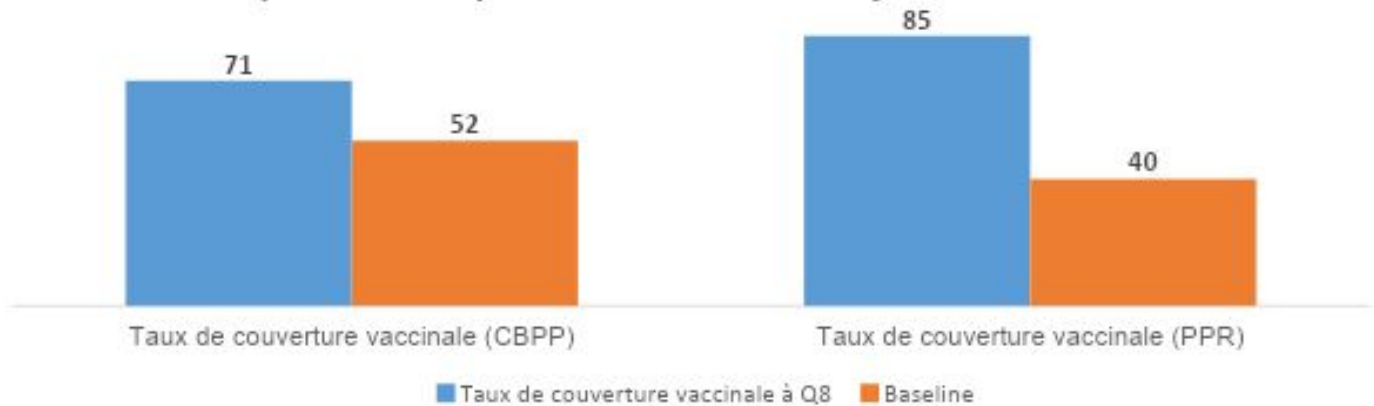

Section 2: Rapport de Terrain

- Démarrage de la vaccination avec marquage des petits ruminants
- Poursuite de l'étude sur la réforme sur le fonds durable de vaccination
- Etablissements des accords sociaux sur les sous projets des plans d'aménagements pastoraux des communes pilotes (Dioundou, Zabori, Simiri, Dingazi)

Section 3: Perspectives pour le prochain trimestre

- Finalisation de l'étude sur la réforme du fonds durable de vaccination
- Poursuite de l'établissement des accords sociaux
- Démarrage des analyses sur l'occupation des corridors
- Attente des premiers APS des marchés à bétail.
